

RECURSO HUMANO

AVANCE A LA SEMANA 15

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

- 1 Superintendente de proyecto
- 2 Residentes de proyecto
- 4 Asistente de ingeniería

ENCARGADOS DE OBRA

- 0 Encargado de maquinaria:
- 3 Maestro de obras:
- 3 Administrador de bodega:

OPERATIVOS

- 1 Operadores de bomba de concreto
- 2 Operador de torre grua
- 13 Ayudantes
- 29 Total del equipo de trabajo

EGRESADOS QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE EJECUCIÓN

7

TOTAL DE COLABORADORES EN OBRA

280

EQUIPO

2 TORRE GRUA



0 EXCAVADORA



0 TROEXCAVADORA



0 MINI EXCAVADORA



0 MINI CARGADOR



1 BOMBA PARA CONCRETO



MOVIMIENTO DE TIERRAS

100%

1,010 M³

100%

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONCRETO ESTRUCTURAL

NAILING + SHOTCRETE

525,000

100%

100%

KG. DE ACERO

MUROS NAILING

PILOTES

OBRA GRIS

100%

100%

645 ML

ZAPATAS ARMADURÍA

ZAPATAS FUNDICIÓN

COLUMNAS ARMADURÍA

578 ML

32,580

6,609


COLUMNAS FUNDICIÓN

ACERO ESTRUCTURAL

M³ CONCRETO ESTRUCTURAL

METAS SEMANA 16

1	FUNDICIÓN DE LOSA NIVEL 1, SECTOR 1.-
2	COLOCACIÓN DE CONCRETO DE LOSA, NIVEL 1, SECTOR 2.-
3	ENTARIMADO Y ARMADO DE LOSA, NIVEL 1, SECTOR 3.-
4	ARMADO DE DINTELES Y TARIMA DE LOSA, SÓTANO 2, SECTOR 4.-
5	FUNDACIÓN DEL 20% DE LOSA SÓTANO 3 Y ARMADO DE TARIMA, LOSA SÓTANO 2, SECTOR 5.-
6	FUNDICIÓN DE LOSA DE CISTERNA DE AGUA POTABLE.-

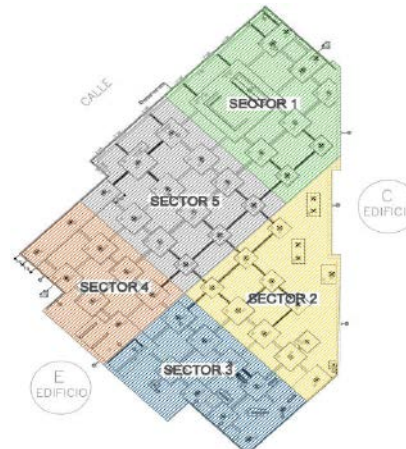

NÚMERO DE PLANOS QUE CONFORMAN LA PLANIFICACIÓN DE ESTE PROYECTO

599

DÍAS SIN ACCIDENTES

203



DISEÑO Y CREATIVIDAD

Laboratorios de diseño interactivo, videojuegos y producción audiovisual
Estudio de grabación audiovisual
Aula de creatividad y diseño
Coder Dojo y Hacker Space
Cámara de observación

