

RECURSO HUMANO

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

- 1 Superintendente de proyecto
- 2 Residentes de proyecto
- 3 Asistente de ingeniería

ENCARGADOS DE OBRA

- 0 Encargado de maquinaria:
- 3 Maestro de obras:
- 3 Administrador de bodega:

OPERATIVOS

- 1† Operadores de maquinaria
- 2 Operador de torre grua
- 10 Ayudantes
- 25 Total del equipo de trabajo

EGRESADOS QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE EJECUCIÓN

4

TOTAL DE COLABORADORES EN OBRA

271

EQUIPO

2 TORRE GRUA



0 EXCAVADORA



0 TROEXCAVADORA



0 MINI EXCAVADORA



0 MINI CARGADOR




1 BOMBA PARA CONCRETO



METAS SEMANA 14

1	ENTARIMADO DE LOSA, NIVEL 1, SECTOR 1.-
2	ENTARIMADO DE LOSA, NIVEL 1, SECTOR 2.-
3	ARMADO Y FUNDICIÓN DE COLUMNAS, SÓTANO 1, SECTOR 3.-
4	ENTARIMADO DE LOSA, SÓTANO 4, SECTOR 4.-
5	FUNDICIÓN DE LOSA, SÓTANO 4, SECTOR 5.-

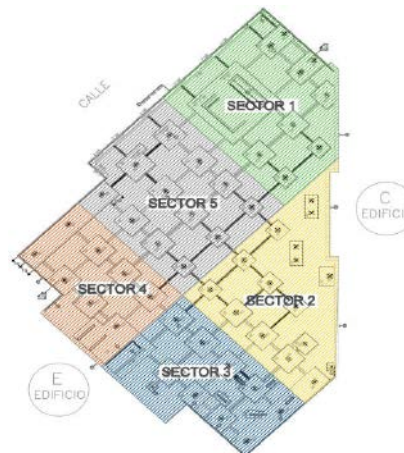

AVANCE A LA SEMANA 13

MOVIMIENTO DE TIERRAS

100%

1,010 M³

100%

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONCRETO ESTRUCTURAL

NAILING + SHOTCRETE

525,000

100%

100%

KG. DE ACERO

MUROS NAILING

PILOTES

OBRA GRIS

100%

100%

613,5 ML

ZAPATAS ARMADURÍA

ZAPATAS FUNDICIÓN

COLUMNAS ARMADURÍA

517 ML

26,750

5,955.25

COLUMNAS FUNDICIÓN

ACERO ESTRUCTURAL

M³ CONCRETO ESTRUCTURAL


NÚMERO DE PLANOS QUE CONFORMAN LA PLANIFICACIÓN DE ESTE PROYECTO

599

DÍAS SIN ACCIDENTES

189

NIVEL 02



INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Aula de Networking

Flexspace

Laboratorios STEM

Laboratorios de métodos y procesos

Laboratorios de business intelligence

Aula de innovación empresarial
