

RECURSO HUMANO

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

- 1 Superintendente de proyecto
- 2 Residentes de proyecto
- 4 Asistente de ingeniería

ENCARGADOS DE OBRA

- 3 Maestro de obras:
- 3 Administrador de bodega:

OPERATIVOS

- 1 Operadores de bomba de concreto
- 2 Operador de torre grua
- 13 Ayudantes
- 30 Total del equipo de trabajo

EGRESADOS QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE EJECUCIÓN

7

TOTAL DE COLABORADORES EN OBRA

280

EQUIPO

2 TORRE GRUA



0 EXCAVADORA



0 TROEXCAVADORA



0 MINI EXCAVADORA



0 MINI CARGADOR




1 BOMBA PARA CONCRETO



METAS SEMANA 17

- | | |
|---|---|
| 1 | Fundición de columnas, primera etapa, nivel 1, sector 1.- |
| 2 | Fundición de columnas, primera etapa, nivel 1, sector 2.- |
| 3 | Armado de tarima y acero, losa nivel 1, sector 3.- |
| 4 | Armado de tarima, losa sótano 3, sector 4.- |
| 5 | Armado de tarima y acero, losa sótano 2, sector 5.- |
| 6 | Fundición de losa sobre cisterna de agua potable, sector 5 y fundición de piso de cisterna 3, área de rampa.- |

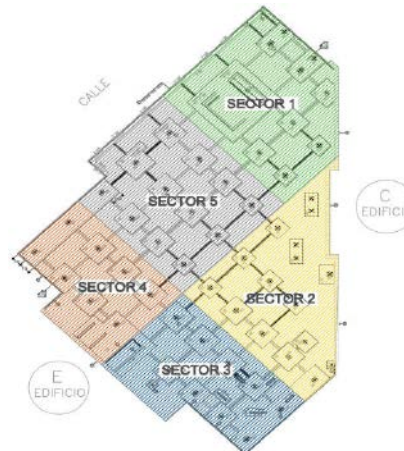

AVANCE A LA SEMANA 16

MOVIMIENTO DE TIERRAS

100%

1,010 M³

100%

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONCRETO ESTRUCTURAL

NAILING + SHOTCRETE

525,000

100%

100%

KG. DE ACERO

MUROS NAILING

PILOTES

OBRA GRIS

100%

100%

645 ML

ZAPATAS ARMADURÍA

ZAPATAS FUNDICIÓN

COLUMNAS ARMADURÍA

578 ML

32,580

7,335

COLUMNAS FUNDICIÓN

ACERO ESTRUCTURAL

M³ CONCRETO ESTRUCTURAL

NÚMERO DE PLANOS QUE CONFORMAN LA PLANIFICACIÓN DE ESTE PROYECTO

599

DÍAS SIN ACCIDENTES

6



DISEÑO Y CREATIVIDAD

Laboratorios de diseño interactivo, videojuegos y producción audiovisual
Estudio de grabación audiovisual
Aula de creatividad y diseño
Coder Dojo y Hacker Space
Cámara de observación

