

RECURSO HUMANO

AVANCE A LA SEMANA 17

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

- 1 Superintendente de proyecto
- 2 Residentes de proyecto
- 4 Asistente de ingeniería

- 1 Gestor de seguridad industrial

ENCARGADOS DE OBRA

- 3 Maestro de obras:
- 3 Administrador de bodega:

OPERATIVOS

- 2 Operador de torre grua
- 1 Operadores de bomba de concreto
- 14 Ayudantes
- 31 Total del equipo de trabajo

EGRESADOS QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE EJECUCIÓN

7

TOTAL DE COLABORADORES EN OBRA

280

EQUIPO

2 TORRE GRUA



0 EXCAVADORA



0 TROEXCAVADORA



0 MINI EXCAVADORA



0 MINI CARGADOR



1 BOMBA PARA CONCRETO



MOVIMIENTO DE TIERRAS

100%

1,010 M³

100%

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONCRETO ESTRUCTURAL

NAILING + SHOTCRETE

525,000

100%

100%

KG. DE ACERO

MUROS NAILING

PILOTES

OBRA GRIS

100%

100%

714 ML

ZAPATAS ARMADURÍA

ZAPATAS FUNDICIÓN

COLUMNAS ARMADURÍA

637 ML

32,663.97

7,481


COLUMNAS FUNDICIÓN

ACERO ESTRUCTURAL

M³ CONCRETO ESTRUCTURAL

METAS SEMANA 18

1	Fundición de muros de concreto, primera etapa e inicio de entarimado doble altura, sector 1.
2	Fundición de columnas segunda etapa e inicio de entarimado doble altura, sector 2.-
3	Fundición de concreto, losa nivel 1, sector 3.-
4	Fundición de concreto, losa sótano 3, sector 4.-
5	Entarimado de losa, sótano 2, sector 5.-
6	Fundición de muros de cisterna número 3.-

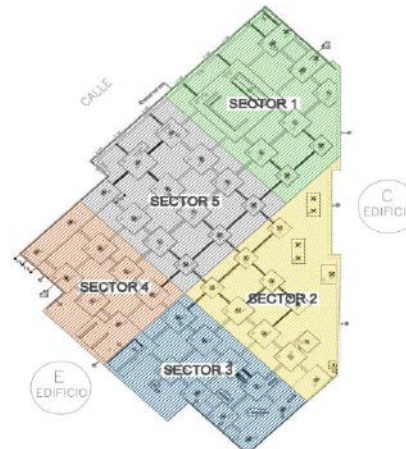

NÚMERO DE PLANOS QUE CONFORMAN LA PLANIFICACIÓN DE ESTE PROYECTO

599

DÍAS SIN ACCIDENTES

12

NIVEL 05



INNOVACIÓN EDUCATIVA

- Aulas de Aprendizaje Activo
- Aulas Socráticas
- Aulas de Design Thinking
- Aulas TEAL
- Auditorios
