

RECURSO HUMANO

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

- 1 Superintendente de proyecto
- 2 Residentes de proyecto
- 4 Asistente de ingeniería

- 1 Gestor de seguridad industrial

ENCARGADOS DE OBRA

- 3 Maestro de obras:
- 3 Administrador de bodega:

OPERATIVOS

- 2 Operador de torre grua
- 1 Operadores de bomba de concreto
- 15 Ayudantes
- 32 Total del equipo de trabajo

EGRESADOS QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE EJECUCIÓN

7

TOTAL DE COLABORADORES EN OBRA

280

EQUIPO

2 TORRE GRUA



0 EXCAVADORA



0 TROEXCAVADORA



0 MINI EXCAVADORA



0 MINI CARGADOR




1 BOMBA PARA CONCRETO



METAS SEMANA 19

- | | |
|---|--|
| 1 | Fundición de muros de concreto, primera etapa e inicio de entarimado doble altura sector 1.- |
| 2 | Entarimado de losa a doble altura, nivel 1, sector 2.- |
| 3 | Fundición de columnas segunda etapa y entarimado de losa a doble altura, nivel 1, sector 3.- |
| 4 | Entarimado de losa, sótano 2, sector 4.- |
| 5 | Entarimado de losa sótano 2, sector 5.- |
| 6 | Armado + Fundición de rampa, sótano 3 al 4.- |

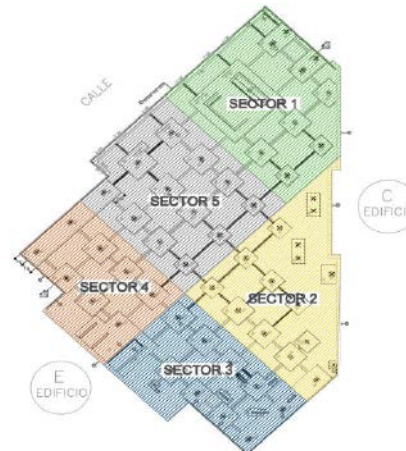

AVANCE A LA SEMANA 18

MOVIMIENTO DE TIERRAS

100%

1,010 M³

100%

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONCRETO ESTRUCTURAL

NAILING + SHOTCRETE

525,000

100%

100%

KG. DE ACERO

MUROS NAILING

PILOTES

OBRA GRIS

100%

100%

765 ML

ZAPATAS ARMADURÍA

ZAPATAS FUNDICIÓN

COLUMNAS ARMADURÍA

705 ML

41,338

8,472

COLUMNAS FUNDICIÓN

ACERO ESTRUCTURAL

M³ CONCRETO ESTRUCTURAL

NÚMERO DE PLANOS QUE CONFORMAN LA PLANIFICACIÓN DE ESTE PROYECTO

599

DÍAS SIN ACCIDENTES

20

NIVEL 06



LIDERAZGO EJECUTIVO

- Aulas ejecutivas
- Aulas de pensamiento de diseño
- Salón de profesores
- Centro de Emprendimiento
- Oficina de Transferencia Tecnológica

