

## RECURSO HUMANO

## AVANCE A LA SEMANA 19

### ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

- 1 Superintendente de proyecto
- 2 Residentes de proyecto
- 4 Asistente de ingeniería
- 1 Gestor de seguridad industrial

### ENCARGADOS DE OBRA

- 3 Maestro de obras:
- 3 Administrador de bodega:

### OPERATIVOS

- 2 Operadores de grúas
- 1 Operador de retroexcavadora
- 1 Operadores de bomba de concreto
- 15 Ayudantes
- 33 Total del equipo de trabajo

EGRESADOS QUE CONFORMAN EL EQUIPO DE EJECUCIÓN

7

TOTAL DE COLABORADORES EN OBRA

295

## EQUIPO

2 TORRE GRUA



0 EXCAVADORA



1 TROEXCAVADORA



0 MINI EXCAVADORA



0 MINI CARGADOR



1 BOMBA PARA CONCRETO



### MOVIMIENTO DE TIERRAS

100%

1,010 M<sup>3</sup>

100%

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CONCRETO ESTRUCTURAL

NAILING + SHOTCRETE

525,000

100%

100%

KG. DE ACERO

MUROS NAILING

PILOTES

### OBRA GRIS

100%

100%

794 ML

ZAPATAS ARMADURÍA

ZAPATAS FUNDICIÓN

COLUMNAS ARMADURÍA

730 ML

42,897

8,652.25


COLUMNAS FUNDICIÓN

ACERO ESTRUCTURAL

M<sup>3</sup> CONCRETO ESTRUCTURAL

## METAS SEMANA 20

1	Entarimado de losa a doble altura, sector 1.-
2	Fundición de losa, nivel 2, sector 2.-
3	Entarimado de losa a doble altura, sector 3.-
4	Armado de losa, sótano 1, sector 4.-
5	Fundición de losa, sótano 1, sector 5.-
6	Fundición de rampa de sótano 3 a sótano 2.-

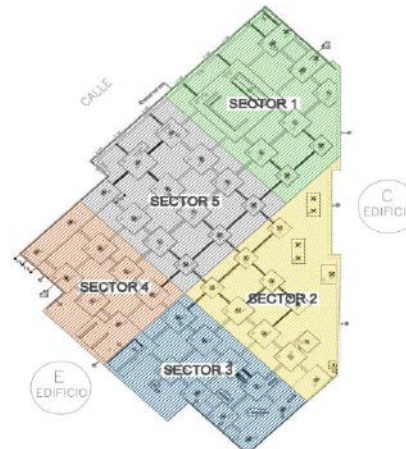

NÚMERO DE PLANOS QUE CONFORMAN LA PLANIFICACIÓN DE ESTE PROYECTO

599

DÍAS SIN ACCIDENTES

27

# NIVEL 07



## COMUNIDAD

- Observatorio y Estación Meteorológica
- Salón de Eventos
- Cafetería
- Auditorio

